

COMMESSE CANTIERI

Controllo Redditività per Cantieri e Impiantisti

Commesse Cantieri

Gestione amministrativa e contabile completa delle commesse su cantieri e impianti, con analisi della redditività e dei SAL

Gestione Commesse per Cantieri e per Impiantisti

KING COMMESSE CANTIERI gestisce tutti gli aspetti amministrativo – contabili utili a controllare la redditività dei cantieri: è stato appositamente realizzato per fornire uno strumento di controllo completo per tutte quelle aziende che effettuano lavorazioni su commessa nonché alle imprese di costruzioni, d'impiantistica.

Il software permette di effettuare, oltre alla classica gestione inventariale del magazzino e della commessa in atto, una **gestione economica delle varie commesse** per quanto riguarda le lavorazioni (ore operai, ammortamento macchinari ecc..) e l'evoluzione dei costi dei materiali relativi ai prezzi d'acquisto praticati dai fornitori (che si riversano a loro volta sui prezzi praticati ai clienti). In questo modo è possibile conoscere in tempo reale i **costi effettivi delle commesse** e verificarne la redditività mettendo in relazione i dati delle commesse con i ricavi derivanti dalla registrazione delle fatture attraverso l'impostazione dei riferimenti della contabilità analitica.

Tipologie di movimentazioni

Sono gestibili le seguenti tipologie di movimentazione:

- Carico di materiali sulla commessa e scarico automatico del magazzino.
- Carico di materiali sulla commessa direttamente dai movimenti d'acquisto dal fornitore (con aggiornamento automatico del magazzino sia in scarico che in carico da acquisto)
- Registrazione di costi diretti sulla commessa e delle ore di manodopera che non andranno a movimentare il magazzino
- Trasferimenti di materiali tra commesse che non influenzano la situazione di magazzino
- Resi tra le commesse e il magazzino, che in automatico scaricheranno la commessa e ricaricheranno il magazzino
- Movimenti d'inventario di commessa, che permettono di forzare la giacenza delle commesse a fronte situazioni anomali riscontrate
- Gestione archivio dei subappalti collegati alla commessa
- Ricevimento Ordini da Fornitori
- La stampa analitica dei materiali
- Stampa sintetica
- Stampa di riepilogo

Stampe di analisi e controllo redditività

Per la gestione e il controllo delle commesse e dei cantieri sono disponibili funzioni e statistiche analitiche, completamente personalizzabili. Tra le più significative, è possibile ottenere l'analisi costi / ricavi della commessa, che permette di confrontare i costi della commessa, derivanti dalle movimentazioni effettuate, con i ricavi ottenuti dalla registrazione delle fatture di vendita emesse collegate alla commessa (sia dal ciclo attivo che direttamente dalla prima nota Iva in contabilità generale). Per il controllo dei costi di manodopera, inoltre, è possibile elaborare situazioni che evidenziano l'impegno delle singole risorse sulla singola commessa, o su più commesse in un determinato periodo (per esempio, ore lavorate per mese)

Gestione Costi del personale

Per il controllo dei costi di manodopera, inoltre, è possibile elaborare situazioni che evidenziano l'impegno delle singole risorse sulla singola commessa, o su più commesse in un determinato periodo (per esempio, ore lavorate per mese).

Gestione capitolati e Avanzamento Commesse)

KING COMMESSE CANTIERI è integrabile con la gestione analitica dei capitolati, per tenere sotto controllo l'avanzamento lavori

- Caricamento Capitolati per commessa da EXCEL o file CSV
- Dettaglio Voci di capitolo con assegnazione Articoli e ordini a Fornitori
- Gestione avanzamento lavori (emissione SAL e fatturazioni a saldo)
- Consuntivi e analisi per capitolati
- Stampa Residui di commessa
- Stampa tesoreria di commessa
- Collegamento in Linea con "King Cash Flow" per avere sotto controllo la situazione finanziaria generale Aziendale

Controllo dei Materiali

Il modulo standard Commesse e Cantieri permette di gestire la movimentazione verso i cantieri e di calcolare in tempo reale la progressione dei costi sostenuti al fine di verificarne la redditività. È prevista la movimentazione di materiali, addebito di costi forniti da società esterne e inserimento delle ore lavorate dal personale interno.

Continuando a gestire le normali operazioni di magazzino, si potranno affiancare le movimentazioni che andranno a toccare le varie commesse, gestibili nelle seguenti tipologie:

Movimentazione materiali

- Movimenti che caricheranno i materiali nella relativa commessa consentendo automaticamente lo scarico del magazzino
- Movimenti d'acquisto diretto dal fornitore che caricheranno i materiali sulla commessa generando automaticamente in magazzino sia l'operazione d'acquisto che di scarico
- Movimenti di trasferimento materiali tra commesse che non influenzano la situazione di magazzino
- Resi tra le commesse e il magazzino, che in automatico scaricheranno la commessa e ricaricheranno il magazzino
- Movimenti di inventario di commessa che permettono di forzare la giacenza delle commesse a fronte situazioni anomali riscontrate


Costi

- Movimenti che riguardano la registrazione di costi diretti sulla commessa e delle ore di manodopera che non andranno a movimentare il magazzino

Manodopera

- Possibilità di gestire la manodopera, movimentandola come un articolo di magazzino.
- I movimenti collegati alle commesse saranno visualizzabili da un'apposita funzione nella quale è possibile inserire le tipologie di movimentazione previste, che potranno essere associate ad articoli di magazzino.
- Tutte le movimentazioni legate gestione delle commesse \ cantieri concorreranno alla determinazione dei saldi e verranno incluse nella reportistica standard.

La movimentazione si basa su articoli di magazzino per i quali viene definito il tipo di articolo. La movimentazione dei costi e delle ore non movimentata il magazzino ma solo il cantiere. I cantieri sono definiti nella tabella delle commesse di analitica

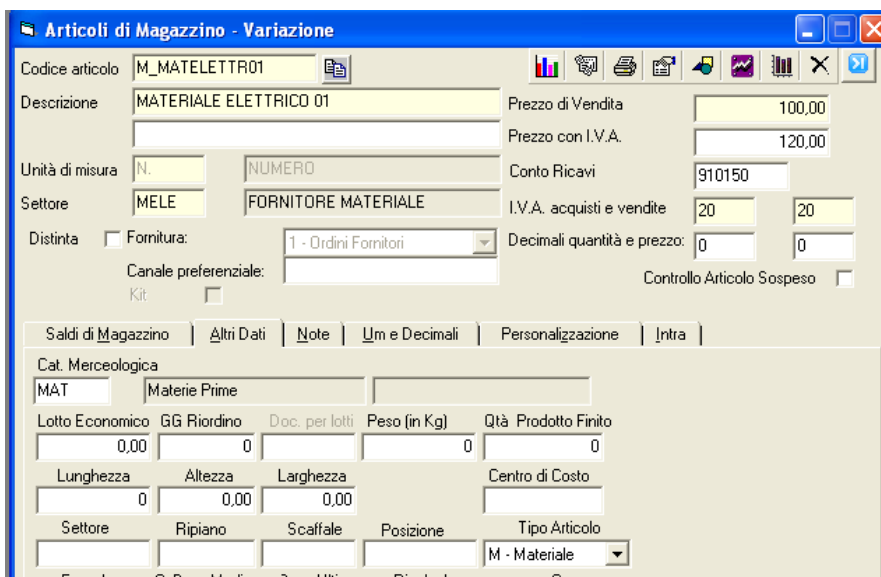

Movimentazioni di magazzino

La movimentazione è regolata dalle casuali di magazzino che devono prevedere tutte le possibili casistiche verso il cantiere e dal cantiere.

Causali Movimentazione (Ctrl+S = Stampa)		
Codice	Descrizione	Tipo
INC	INVENTARIO COMMESSA (CARICO)	C
RCC	RESO A MAGAZZINO DA CANTIERE	C
INM	INVENTARIO COMMESSA (SCARICO)	S
CDC	CARICO DIRETTO COMMESSA	C
CCMA	CARICO A COMMESSA DA COMMESSA	C
CCC	SCARICO COMMESSA E CARICO AD ALTRO COMME	S
CCA	CARICO COMMESSA	C
VENC	CARICO COMMESSA DA DDT	S
CINV	CARICO DA INVENTARIO	C


La movimentazione verso il cantiere può essere effettuata con le seguenti funzioni:

1) DDT verso il cantiere:

Si inserisce il cliente e poi si indica nel campo commessa il codice del cantiere (nella lista vengono visualizzate le commesse legate al cliente).

È stato inserito un automatismo al fine di indicare in modo automatico il destinatario diverso in base al codice della commessa.


Nei destinatari diversi del cliente si deve indicare come convenzione come codice destinatario il codice della commessa.

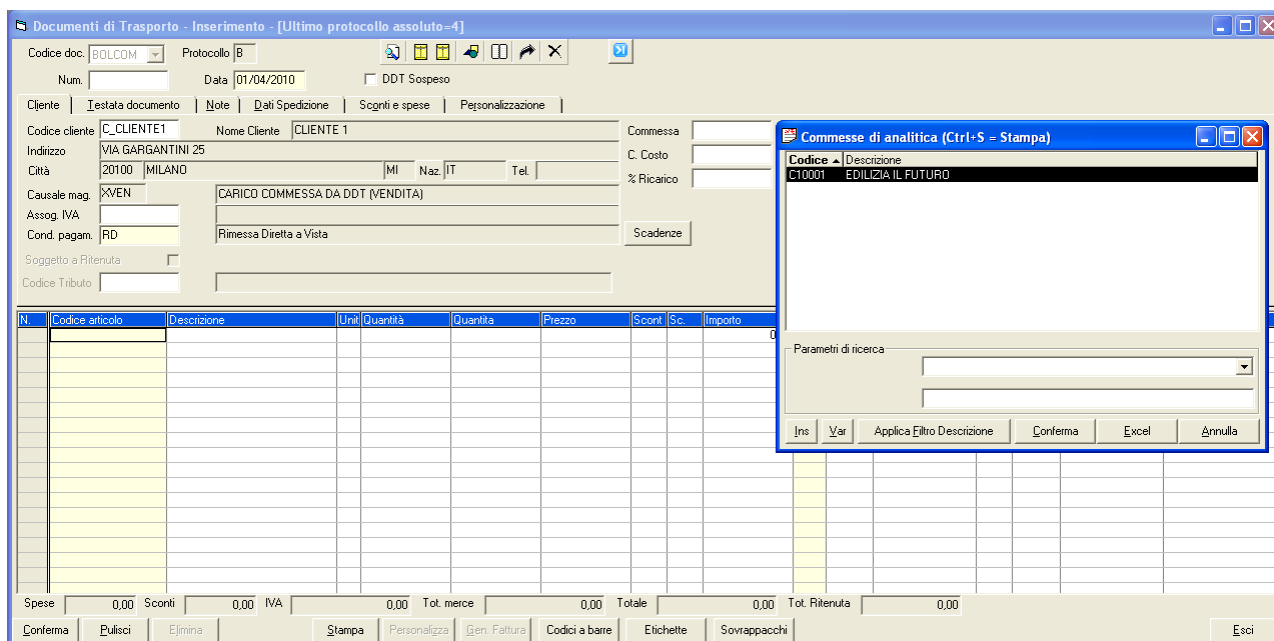

La movimentazione di magazzino avviene tramite un movimento di scarico dal deposito principale e un movimento di carico verso il cantiere.

2) Ricevimento ordine a fornitore con carico diretto su commessa

Nell'ordine a fornitore si deve specificare il codice della commessa

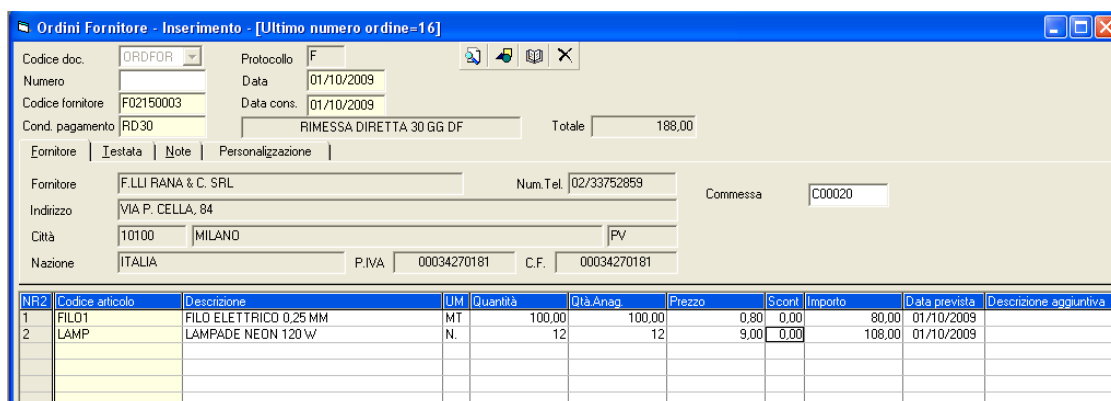

Se eseguiamo quindi il ricevimento merce:

Movimentazione Commesse - Modifica

Num. Data Registrazione:
 Codice Commessa Cantiere Condominio Villa Fiorita Cliente
 Causale CARICO COMMESSA
 N. Documento Data Documento
 Magazzino C.Costo Listino % Ricarico

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	T. Art	C. Costo	Tipo Ora
FILO1	FILO ELETTRICO 0,25 MM	MT	100,00	0,8	80	M		
LAMP	LAMPADE NEON 120 W	N.	12	9	108	M		

3) Movimentazione commesse:

Attraverso la funzione di movimentazione commesse è possibile effettuare tutte le movimentazioni previste per la commessa. Per creare un movimento si inserisce il codice della commessa e la causale di movimentazione

Movimentazione Commesse - Inserimento (13)

Num. Data Registrazione:
 Codice Commessa COMMESSA 1 Cliente GAMMA S.N.C.
 Causale CARICO COMMESSA
 N. Documento Data Documento
 Magazzino C.Costo Listino % Ricarico

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	T. Art	C. Costo	Tipo Ora
FILO2	BOBINA FILO 0,10 GIALLO	N.	10	15	150	M		

Le movimentazioni possibili sono le seguenti:

- Carico della commessa: viene scaricato il magazzino di sede (nello stesso modo di una vendita) e viene generato un carico sulla commessa (nell'archivio dei consumi per commessa).
- Carico diretto commessa: in questo caso vengono generati due movimenti:
- Con il primo viene caricato il magazzino di sede (nello stesso modo di un ricevimento merce da fornitore), con un secondo avviene lo scarico dalla sede e infine viene generato un carico sulla commessa.
- Reso materiale da commessa: per fare ritornare alla sede materiale presente nel cantiere
- Inventario commessa: serve per rettificare in positivo o negativo le giacenze sulla commessa
- Spostamento materiale su commesse: serve per spostare materiale da un cantiere all'altro

La movimentazione può essere effettuata per tutte le tipologie gestite cioè Materiali, Costi e Ore.

Valorizzazioni

Il modulo viene generalmente utilizzato per rilevare i costi dei cantieri ma può essere utilizzato anche per rilevare i valori di vendita in quanto i prezzi vengono proposti in base alla parametrizzazione definita nella causale di movimentazione di magazzino.

Se al momento della movimentazione non si conosce ancora il prezzo è possibile inserire come prezzo il valore zero oppure inserire un prezzo indicativo e specificare un flag che indica il valore provvisorio del dato.

Successivamente con una apposita funzione è possibile riprendere i movimenti incompleti ed assegnare il prezzo definitivo.

Gestione ore del personale


Inserimento ore di manodopera

La funzione di compilazione del foglio di manodopera permette di gestire oltre alla rilevazione delle ore necessarie per la predisposizione del cedolino anche le ore da imputare sulle commesse in modo separato.

È possibile inserire anche le spese sostenute dal dipendente e indicare in un apposito campo di note le informazioni da comunicare al consulente delle paghe attraverso la stampa nel cedolino.

Nella tabella delle causali di manodopera vengono inserite le causali con le quali vengono inserite le ore ai fini di produrre la stampa del foglio presenze.


Per le causali che prevedono il lavoro sulle commesse si deve attivare l'apposito flag in modo tale che durante la compilazione venga richiesta in modo obbligatorio la commessa.

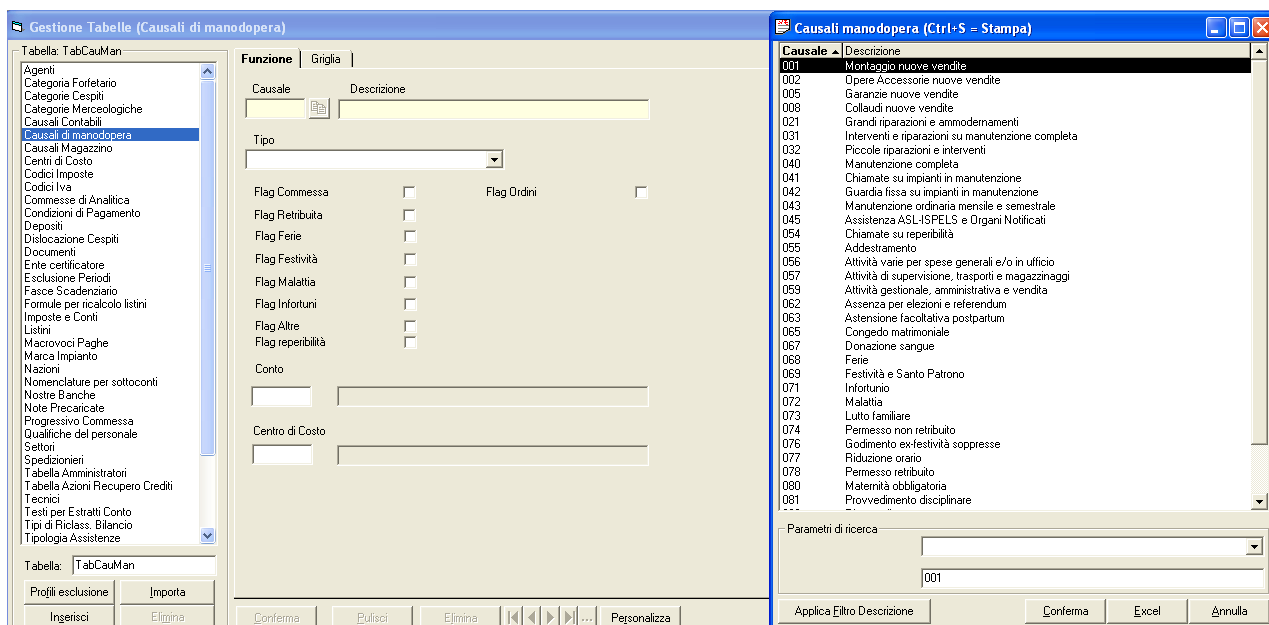

Il calendario permette di specificare i giorni festivi in modo tale di poter riconoscere il lavoro nei giorni festivi per il foglio delle presenze.

Vediamo in dettaglio le operazioni: nella griglia principale inseriamo attraverso le causali di manodopera le ore per il giorno. Poi premiamo il pulsante 'Imputazione ore su commesse' e indichiamo nella nuova maschera i seguenti campi:

- Codice della commessa: da tabella delle commesse
- Codice della lavorazione: da tabella delle lavorazioni (di fianco viene visualizzata la descrizione che può essere variata dall'operatore)
- Ore: numero di ore espresse in centesimi di ore
- Prezzo ora: viene proposto il prezzo in base all'impostazione dei parametri della procedura e alla tariffa attuale definita sul tecnico. Il campo è modificabile
- Importo totale: il campo viene calcolato
- Note: opzionalmente è possibile inserire delle note descrittive sulla lavorazione effettuata.

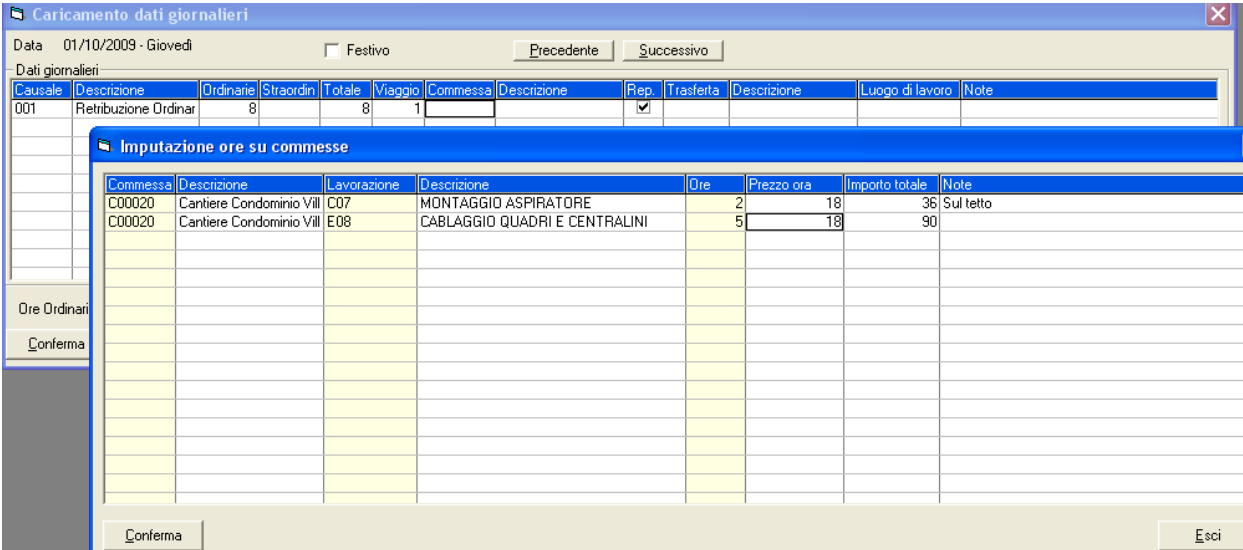

Caricamento dati giornalieri

Data: 01/10/2009 - Giovedì ☐ Festivo Precedente Successivo

Dati giornalieri

Causale	Descrizione	Ordinarie	Straordinarie	Totale	Viaggio	Commessa	Descrizione	Rep.	Trasferta	Descrizione	Luogo di lavoro	Note
001	Ributazione Ordinaria	8		8	1			<input checked="" type="checkbox"/>				

Imputazione ore su commesse

Commessa	Descrizione	Lavorazione	Descrizione	Ore	Prezzo ora	Importo totale	Note
C00020	Cantiere Condominio Vill	C07	MONTAGGIO ASPIRATORE	2	18	36	Sul tetto
C00020	Cantiere Condominio Vill	E08	CABLAGGIO QUADRI E CENTRALINI	5	18	90	

Ore Ordinarie:

Conferma Esci

Rimborso Spese

Premendo il pulsante 'Rimborso Spese' viene visualizzata una nuova maschera nella quale si possono inserire le voci di rimborso. L'impostazione non è giornaliera ma per tutto il mese per cui all'apertura della maschera vengono visualizzate tutte le righe relative al mese in elaborazione.

Sono richiesti i seguenti campi:

- Data: indicare la data relativa alla spesa (è un giorno all'interno del mese / anno in elaborazione)
- Tipo spesa: indicare il codice della spesa come da tabella spesa
- Descrizione spesa: viene riportata la descrizione della voce di spesa
- Quantità: si deve indicare la quantità movimentata
- Valore: indicare il prezzo singolo della spesa
- Importo: viene calcolato l'importo della riga
- Note: è possibile specificare una nota descrittiva per dettagliare meglio la spesa

Movimentazione Commesse - Modifica

Num. Data Registrazione:
 Codice Commessa Cantiere Condominio Villa Fiorita Cliente
 Causale CARICO COMMESSA
 N. Documento Data Documento
 Magazzino C.Costo Listino % Ricarico

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	T. Art	C. Costo	Tipo Ora
01	ORE TECNICI	HR	2,00	18	36	0		
01	ORE TECNICI	HR	5,00	18	90	0		

Le righe invece corrispondono alle singole righe movimentate nelle quali è indicato il codice della lavorazione.

Movimentazione Commesse - Modifica

Num. Data Registrazione:
 Codice Commessa Cantiere Condominio Villa Fiorita
 Causale CARICO COMMESSA
 N. Documento Data Documento
 Magazzino C.Costo

Lavorazione	Descrizione
C07	MONTAGGIO ASPIRATORE
E08	CABLAGGIO QUADRI E CENTRALINI

Stampe e Statistiche


La gestione delle commesse e cantieri consente quindi di movimentare ed attribuire ad ogni commessa materiali, costi e manodopera, elaborando specifici reports di stampa, che permettono di ottenere dati rilevanti sulla situazione delle commesse, esposti in modo sintetico o dettagliato secondo le scelte dell'utente.

È possibile ottenere situazioni di commesse alla data, che evidenziano i totali di materiali, ore lavorative e costi impiegati sulla commessa, con anche il dettaglio di tutte le singole movimentazioni associate. In generale, nelle stampe è possibile riportare solo i valori della quantità, oppure estrapolare situazioni che valorizzano anche i movimenti, in base a diversi criteri impostabili dall'utente (costo della movimentazione - costo ultimo - costo medio - listino...).

Stampa del foglio presenze

La funzione permette di stampare il foglio presenze dei dipendenti in modo tale di essere inviato al consulente delle paghe che lo prenderà come base per la compilazione dei cedolini.

La funzione richiede il mese da elaborare e l'intervallo dei tecnici da stampare

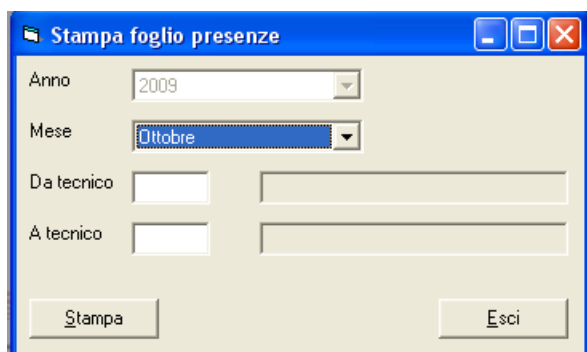

Stampa foglio presenze

Anno: 2009

Mese: Ottobre

Da tecnico:

A tecnico:

Stampa Esci

Esempio di stampa:

Società' DEMO															
Via P. Neri, 10 - 20093 Cologno Monzese MI															
C.F. 02966550879 - P.I. 02966550879															
FOGLIO PRESENZE															
Nominativo: ROSSI MARIO															
Matricola: M 123															
Ottobre 2009															
GG			Totale Giorno	Ordin.	Straord.	Viaggio	Trasferta Esente	Trasferta Soggetta	FE	PE	MA	IN	Altro	Rimb. Docum.	Rimb. KM
1	Giovedì	LV	9,00	8,00		1,00							8,00 Retribuzione	28,50	13,50
2	Venerdì	LV	8,00	8,00									8,00 Retribuzione		
3	Sabato	FE													
4	Domenica	FE													
5	Lunedì	LV	8,00	8,00			40,00						8,00 Retribuzione		
6	Martedì	LV	8,00	8,00					8,00						
7	Mercoledì	LV	8,00	8,00									8,00 Retribuzione		
8	Giovedì	LV	8,00	8,00									8,00 Retribuzione		
9	Venerdì	LV	8,00	8,00									8,00 Retribuzione		
10	Sabato	FE													
11	Domenica	FE													
12	Lunedì	LV	8,00	8,00							8,00				
13	Martedì	LV	8,00	8,00							8,00				
14	Mercoledì	LV	8,00	8,00							8,00				
15	Giovedì	LV	8,00	8,00								8,00			
16	Venerdì	LV	8,00	8,00								8,00			
17	Sabato	FE													
18	Domenica	FE													

La stampa riporta in orizzontale tutti i giorni del mese.

Nella terza colonna viene indicato se il giorno è lavorativo (LV) o festivo (FE) in base a quando definito nel calendario.

Di seguito vengono riportate le seguenti colonne:

- Totale giorno: è la somma delle ore giornaliere (ordinarie + straordinarie + viaggio)
- Ordin.: numero di ore ordinarie
- Straord.: numero di ore straordinarie
- Viaggio: numero di ore di viaggio
- Trasferta esente: Se il tipo di trasferta è esente viene riportato l'importo della trasferta in base a quanto indicato nelle tariffe del tecnico.
- Trasferta soggetta: Se il tipo di trasferta è soggetta viene riportato l'importo della trasferta in base a quanto indicato nelle tariffe del tecnico.
- FE: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di festività
- PE: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di permesso
- MA: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di malattia
- IN: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di infortunio
- Altro: per gli altri tipi di causali vengono indicate le ore e la descrizione della causale
- Rimborso documentato: viene riportato l'importo delle spese sostenute per le causali di spese con la tipologia (autostrada, ristoranti, soste e parcheggi e spese varie).
- Rimborso KM: viene calcolato il rimborso chilometrico

Nel corpo vengono riportate le voci di spesa in modo singolo o raggruppato per codice come definito nella tabella delle spese. Le spese vengono suddivise in:

- Spese documentate
- Spese non documentate
- Pasti
- Km

Società' DEMO Via P. Nenni, 10 - 20093 Cologno Monzese MI C.F. 02966550879 - P.I. 02966550879				Pagina 1 di 1		
<p>LETTERA DI INCARICO Si incarica il nostro dipendente Signor / a ROSSI MARIO Matricola M 123 a svolgere per n. conto la seguente mansione: CAPO CANTIERE</p> <p>Periodo Ottobre Anno 2009 31/10/2009</p> <p>RIMBORSI CHILOMETRICI Si autorizza il nostro dipendente, Signor / a ROSSI MARIO Matricola M 123 ad usare il proprio automezzo per effettuare i percorsi necessari a svolgere la mansione sopra descritta</p>						
	Descrizione spesa		Spese Documentate	Spese non Documentate	Pasti	Km
01/10/2009	AUTOSTRADA CHILOMETRI RISTORANTI		€ 4,50			45,00
			€ 4,50		€ 24,00	45,00

Alla fine, viene riportato uno specchietto che indica il totale delle spese al netto del rimborso chilometrico, il rimborso chilometrico con il numero di chilometri e il prezzo per chilometro e si calcola il totale generale delle spese.

Sulla parte di sinistra viene indicata la zona che dovrà firmare il dipendente e la società

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Per autorizzazione Società' DEMO _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Il sottoscritto dichiara che tutte le spese qui sopra descritte sono inerenti allo svolgimento della missione affidatagli _____ ROSSIMARIO </div>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Totale spese</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 28,50</td> </tr> <tr> <td>Rimborso Km</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> <td style="text-align: center;">€ 0,30</td> <td style="text-align: right;">€ 13,50</td> </tr> <tr> <td>Totale da rimborsare</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 42,00</td> </tr> </table>	Totale spese			€ 28,50	Rimborso Km	45,00	€ 0,30	€ 13,50	Totale da rimborsare			€ 42,00
Totale spese			€ 28,50										
Rimborso Km	45,00	€ 0,30	€ 13,50										
Totale da rimborsare			€ 42,00										


Stampato con King- (Spese Docrpt)

Contratti commesse

Se la società si avvale anche di ditte esterne per subappaltare i lavori oppure per lavorazioni saltuarie è possibile registrare separatamente i costi di queste lavorazioni in modo tale di poterle includere nei costi del cantiere; in questo modo non sarà necessario registrare nelle fatture di acquisto la contabilità analitica.

È possibile indicare in modo svincolato i costi oppure registrare uno o più contratti legati alla commessa in modo tale di verificare successivamente a consuntivo il rispetto delle condizioni contrattuali.

La maschera di inserimento dei contratti è la seguente:

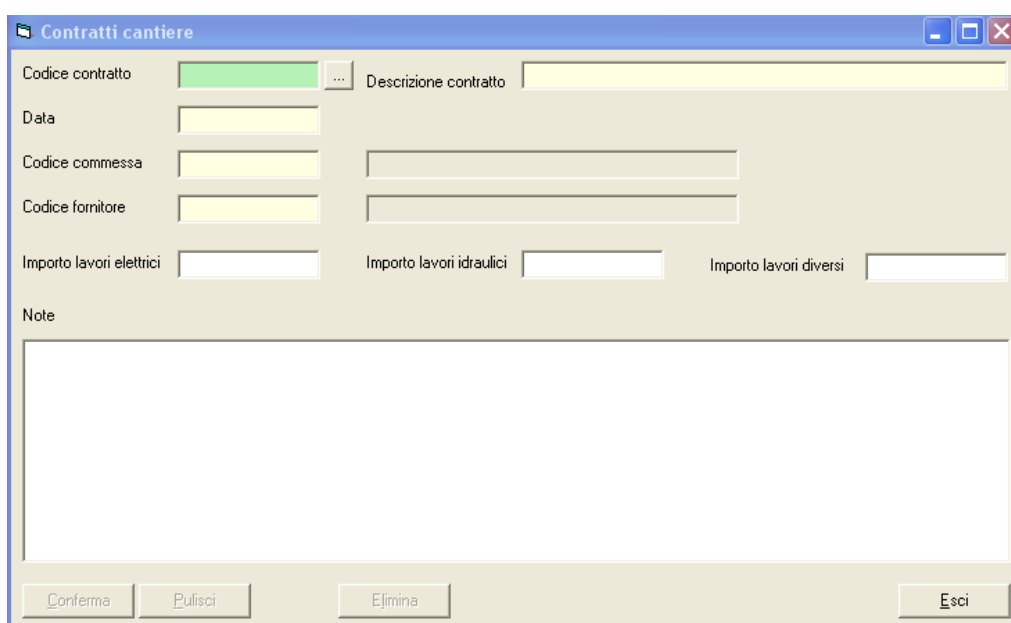

Vengono richiesti i seguenti dati:

- Codice del contratto: è un codice numerico che viene assegnato in automatico dal sistema
- Data: data del contratto
- Codice commessa: il codice della commessa collegata al contratto
- Codice fornitore: si deve indicare il fornitore del contratto che deve essere inserito nell'archivio dei fornitori in quanto dovrà essere registrata la fattura
- Importo lavori elettrici, idraulici, diversi: si deve indicare l'importo stabilito nel contratto eventualmente distribuito tra le 3 possibili caselle.
- Note: è possibile indicare delle note per specificare meglio il contratto

La funzione permette di attribuire alle commesse i costi delle lavorazioni effettuate da imprese esterne regolamentate da contratto oppure sporadiche. Non è previsto un collegamento con la contabilità fornitori per cui i dati vengono inseriti in modo manuale.

[illegible]

I dati richiesti sono i seguenti:

- Tipo di stampa: è possibile selezionare la stampa organizzata per fornitore oppure per commessa
- Fornitore: è possibile selezionare da multilista i fornitori da stampare
- Commessa: è possibile selezionare da multilista le commesse da stampare
- Contratto: è possibile selezionare da multilista i contratti da stampare
- Da data a data: è possibile indicare il periodo da elaborare
- Stampa dettagli: è possibile richiedere una stampa con i soli totali di commessa o fornitore oppure stampare in modo dettagliato le movimentazioni.

Stampa dei dettagli per commessa:

Commessa: 090001 commessa del 2009 numero 1

Fornitore	Lavorazione	Note	Data	Costo	Contratto
FCONTATTO CONTATTO SRL	E04 INFILAGGIO CORDINA	FT. 15/2009	02/10/2009	2.000,00	5 MOLINARI ALDO - MODENA CONTR. 02/2009
FOTTONI OTTONE MELODA SPA	I60 POSA TUBO IMPIANTO COND/GAS	FT. 16/2009	03/10/2009	3.000,00	0
FATCSPA ATC SPA	C09 MONTAGGIO GRIGLIE		04/12/2009	1.000,00	0
Totale commessa				6.000,00	

Stampa dei dettagli per fornitore:

Fornitore: FATCSPA ATC SPA

Commessa	Lavorazione	Note	Data	Costo	Contratto
090002 commessa del 2009 numero 2	C20 POSA TUBO ASPIRAZIONE POLVERI	FATT. 185 A	01/10/2009	2.950,85	4 EDILIZIA' 2000 BOLOGNA - CONTR. 12/2009
090002 commessa del 2009 numero 2	E08 CABLAGGIO QUADRIE CENTRALINI	FT. 201	10/10/2009	3.250,45	8 EDILIZIA' 2000 BOLOGNA - CONTR. 12/2009
090001 commessa del 2009 numero 1	C09 MONTAGGIO GRIGLIE		04/12/2009	1.000,00	0
Totale fornitore				7.201,30	

2) Stampa analisi di cantiere

La stampa permette di ottenere la situazione totale dei costi caricati sulla commessa in modo sintetico e dettagliato.



Stampa analisi cantiere

Cantiere

Da Data

A Data

Analisi Riepilogativa

Sono disponibili le seguenti stampe:

Analisi Riepilogativa
Analisi Sintetica
Analisi Dettagliata

2.1) Analisi riepilogativa

La stampa riporta la situazione totale dei costi suddivisi per settore idraulico, elettrico e altro.

In ordine vengono stampati i seguenti dati:

- Costi dipendenti interni: rilevati da manodopera
- Costi imprese esterne impiantistiche: rilevati da rilevazione costi imprese esterne
- Costi imprese esterne non impiantistiche: rilevati da rilevazione costi imprese esterne
- Costi trasferte: in base a % variabile
- Materiali: in base a movimentazione di magazzino
- Materiali di consumo: in base a % variabile
- Costi generali: in base a % variabile

Stampa sintetica analisi cantiere per commessa								
Da:			A:					
Commessa	040001	EDILIZIA FUTURO						
Cliente	CE DILIZIAD	EDILIZIA FUTURO						
Descrizione	Sett. Idraulico	%	Sett. Elettrico	%	Altri	%	Totale	%
Lavorazioni interne			€ 59.406,00	37,63			59.406,00	37,63
Imprese esterne impiantiste	€ 4.408,50	2,79	€ 2.907,50	1,84	€ 3.480,00	2,20	10.796,00	6,84
Imprese esterne non impiantiste					€ 918,00	0,58	918,00	0,58
Costi trasferte gestiti a forfait			€ 4.293,00	2,72			€ 4.293,00	2,72
Materiali	€ 69.121,02	43,79	€ 16.336,51	10,35			98.101,08	62,14
Materiali di consumo in % 2,00	€ 1.382,42	0,88	€ 326,73	0,21			€ 1.709,15	1,08
Totali Cantiere	€ 74.566,33	43,45	€ 78.895,05	46,48	€ 4.398,00	2,80	€ 157.859,39	
Costi Generali 15,00 %	€ 11.184,95		€ 11.834,26		€ 659,70		€ 23.678,91	
Totale Complessivo	€ 85.751,28		€ 90.729,31		€ 5.057,70		€ 181.538,29	

2.2) Analisi Sintetica

La stampa riporta i dati relativi alla manodopera interna/ esterna e ai materiali in modo sintetico

Stampa sintetica analisi cantiere per commessa			
Da: 01/01/2001		A: 01/01/2006	
Commessa	040001	EDILIZIA FUTURO	
Cliente	CEDILIZIAD	EDILIZIA FUTURO	
Manodopera interna			
Cod.Lav.	Descrizione Lavorazione	Ore	Prezzo totale
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	3,00	63,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	4,00	84,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	4,00	84,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	0,00	0,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	4,50	94,50
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	1,00	21,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	3,00	63,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	1,00	21,00
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	3,50	73,50
C03	POSA TUBO IMP CONDIZIONAMENTO GAS	4,00	84,00
C12	RIPARAZIONE PICCOLI LAVORI (SPECIFICA)	6,50	136,50

199	GES TIONE CANTIERE	2,00	42,00
199	GES TIONE CANTIERE	0,50	10,50
199	GES TIONE CANTIERE	0,50	10,50
199	GES TIONE CANTIERE	2,50	52,50
199	GES TIONE CANTIERE	1,00	21,00
199	GES TIONE CANTIERE	1,00	21,00
Totale		Manodopera interna	2.862,00
			59.406,00

Imprese esterne impiantiste

Fornitore	Cod.Lav.	Descrizione Lavorazione	Importo
FFOGLIO		PRES TAZIONI DA TERZI	1.365,00
FELETTRO		PRES TAZIONI DA TERZI	640,50
FFOGLIO		PRES TAZIONI DA TERZI	136,50
FFOGLIO		POS A TUBO IMPIANTO COND/GAS	52,50
FGLFERR		PRES TAZIONI DA TERZI	846,00
FAMIMPIAN		PRES TAZIONI DA TERZI	380,00
FELETTRO		PRES TAZIONI DA TERZI	115,50
FELETTRO		PRES TAZIONI DA TERZI	31,50
FSCURANI		LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI SU BENI DI TERZI	900,00
FSCURANI		LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI SU BENI DI TERZI	970,00
FSCURANI		LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI SU BENI DI TERZI	860,00
Totale		Imprese esterne impiantiste	26,00
			10.796,00

Imprese esterne non impiantiste

Fornitore	Cod.Lav.	Descrizione Lavorazione	Importo
FSIMONL		SPESE TECNICHE	918,00
Totale		Imprese esterne non impiantiste	1,00
			918,00

Materiale

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Qtà	Costo Totale
CM4X4-3/4	****COLLETTORE MODULARE 4X4 3/4	1,00	35,82
CM8X8-1"	****COLLETTORE MODULARE 8X8 1"	1,00	49,89
CM8X8-3/4	****COLLETTORE MODULARE 8X8 3/4	1,00	42,38
CS 2-3/4	****COLLETTORE SEMPLICE 2 VIE 3/4	2,00	7,20
HGS W080	1 SEG.N.LUM.+ OTTURATORE 1M	3,00	9,36
TCL 4037	2 PULSANTINO INTERBL	20,00	151,00
NMG 26611	VIGI C60 2P 63A 30MA CL AC	1,00	38,74
UTT1145/624	VISIERA ANTIP.2F. 4 MOD.VERT.	1,00	34,18
OMRPYF08AN	ZOCCOLO X MY	22,00	52,14
OMRPYF08AN	ZOCCOLO X MY	12,00	28,44
Totale		Materiale	60.635,12
			85.457,52

Totale Commessa 040001 **156.577,52**

2.3) Analisi Dettagliata

La stampa riporta i dati relativi alla manodopera interna/esterna e ai materiali in modo dettagliato

Stampa dettaglio analisi cantiere per commessa

Da: 01/01/2001 A: 01/01/2006

Commessa 040001 EDILIZIA FUTURO
 Cliente CEDILIZIAD EDILIZIA FUTURO

Manodopera interna

Cod.Dip.	Nome Dipendente	Cod.Lav.	Descrizione Lavorazione	Ore	Prezzo	Prezzo totale
124	FONTI CARLO	E90	ORE VIAGGIO	1,00	21,00	21,00
124	FONTI CARLO	E03	POS A TUBO E SCATOLE ELETTRICHE	5,50	115,50	115,50
90	GUZZI ANGELO	C90	ORE VIAGGIO	1,00	21,00	21,00
90	GUZZI ANGELO	C03	POS A TUBO IMP CONDIZIONAMENTO/GAS	4,00	84,00	84,00
90	GUZZI ANGELO	I05	POS A TUBO SCARICO SOTTO TRACCIA ORRIZ.	4,00	84,00	84,00

3) Stampa materiali per date/commesse

La stampa elenca i movimenti dei materiali utilizzati per la commessa in un periodo

Stampa Movimenti Commesse per Data					dal 01/01/2010		al 31/12/2010			
(stpmcmd)							Stampa del 06/10/2010			
Commissa		Descrizione Commessa								
Data Registrazione										
Codice Articolo	Descrizione Articolo	Um	Cli/For	Cau	N.Mov	N.Doc.	del	Quantità	Valore	
C10001	EDILIZIA IL FUTURO								Data chius.	
02/03/2010	Martedì									
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.	C_CLIENT	XCCA	37	80000		8	144,00	
M_MATELETTRO	MATERIALE ELETTRICO 01	N.	C_CLIENT	XCCA	37	80000		9	185,49	
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.	C_CLIENT	XRCC	38	-		-100	-1.800,00	
M_MATELETTRO	MATERIALE ELETTRICO 01	N.	C_CLIENT	XRCC	38			-100	-45.600,00	
M_MATIDRAULO	MATERIALE IDRAULICO 01	N.	C_CLIENT	XRCC	38			-100	-1.900,00	
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.	-	XCCA	33			101	1.818,00	
M_MATELETTRO	MATERIALE ELETTRICO 01	N.		XCCA	33			102	2.142,00	
M_MATIDRAULO	MATERIALE IDRAULICO 01	N.		XCCA	33			103	1.957,00	
									-43.053,51	
05/03/2010	Venerdì									
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.	C_CLIENT	XCDC	36	1		55	990,00	
M_MATELETTRO	MATERIALE ELETTRICO 01	N.	C_CLIENT	XCDC	36	1		66	1.320,00	
									2.310,00	
06/10/2010	Mercoledì									
M_MATELETTRO	MATERIALE ELETTRICO 01	N.		XCCA	116	1		100	1.740,00	
M_MATIDRAULO	MATERIALE IDRAULICO 02	PZ	C_CLIENT	XCCA	117	80000		1	55,00	
									1.795,00	
21/12/2010	Martedì									
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.		XCCA	119			2	36,00	
									36,00	
									-38.912,51	
TOTALE COMMESSE DAL					01/01/2010	AL	31/12/2010	-38.912,51		

4) Riepilogo materiali per commessa

La stampa raggruppa le movimentazioni dei materiali per codice articolo e le valorizza in base ai criteri parametrizzabili.

Riepilogo Materiali della Commessa						
		C 10001	EDILIZIA IL FUTURO			
Periodo dal		01/01/2010	al		31/12/2010	
(stpinvco)						Stampa del 06/10/2010
Codice Articolo	Descrizione Articolo	Um	Carichi	Scarichi	Es. Attuale	Val. Prezzo
M_MATEDILE01	MATERIALE EDILE 01	N.	66		66	7.920,00
M_MATELETT R01	MATERIALE ELETTRICO 01	N.	177		177	21.240,00
M_MATIDRAUL01	MATERIALE IDRAULICO 01	N.	3		3	360,00
M_MATIDRAUL02	MATERIALE IDRAULICO 02	PZ	1		1	120,00
			TOTALE COMMESSA			29.640,00

5) Stampa movimenti commesse per ore

La stampa elenca le movimentazioni orarie dei dipendenti interni raggruppata per codice del dipendente

MOVIMENTI COMMESSE PER ORE

(Stampa opco) Stampa del 01/04/2010

Manodopera	Commissa	Descrizione Lavoro	Data Lavoro	N° Mov.	Ore	Importo
O_1		CAPO CANTIERE				
C10001		EDILIZIA IL FUTURO				
		CAPO CANTIERE	31/03/2010	40	20,00	300,00
		CAPO CANTIERE	08/03/2010	46	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	10/03/2010	47	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	15/03/2010	51	10,00	150,00
		CAPO CANTIERE	16/03/2010	52	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	22/03/2010	56	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	23/03/2010	57	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	24/03/2010	58	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	09/03/2010	62	8,00	120,00
		CAPO CANTIERE	25/03/2010	63	8,00	120,00
		Totali CAPO CANTIERE			94,00	1.410,00
O_110		BIANCHI LUIGI				
C10001		EDILIZIA IL FUTURO				
		BIANCHI LUIGI	01/03/2010	66	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	02/03/2010	67	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	03/03/2010	68	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	15/03/2010	70	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	17/03/2010	72	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	09/03/2010	61	8,00	120,00
		BIANCHI LUIGI	31/03/2010	40	30,00	540,00
		BIANCHI LUIGI	18/03/2010	115	10,00	150,00
		BIANCHI LUIGI	06/10/2010	118	40,00	720,00
		BIANCHI LUIGI	03/12/2010	122	10,00	150,00
		BIANCHI LUIGI	09/12/2010	123	10,00	150,00
		Totali BIANCHI LUIGI			148,00	2.430,00

6) Stampa movimenti di manodopera per giorno

La stampa riporta le movimentazioni orarie dei dipendenti raggruppate per giorno

Movimenti Manodopera per Date/Commesse - Stampa valorizzata

(Stampa opd1) Stampato il 06/10/2010

Data operazione	Commissa	Descrizione Lavoro	Manodopera	Ore	Importo
01/03/2010					
	C10001	ROSSI GIORGIO	ROSSI GIORGIO	8,00	80,00
	C10001	VERDI GIOVANNI	VERDI GIOVANNI	8,00	120,00
	C10001	BIANCHI LUIGI	BIANCHI LUIGI	8,00	120,00
		Totali al	01/03/2010	24,00	320,00
02/03/2010					
	C10001	BIANCHI LUIGI	BIANCHI LUIGI	8,00	120,00
		Totali al	02/03/2010	8,00	120,00
03/03/2010					
	C10001	BIANCHI LUIGI	BIANCHI LUIGI	8,00	120,00
		Totali al	03/03/2010	8,00	120,00

7) Stampa riepilogo situazione commessa

La stampa riporta i totali della manodopera e dei materiali utilizzati per la commessa

Riepilogo Situazione Commesse Totale		dal	01/12/2010	al	31/12/2010
(stpreom1)		Stampa del		06/10/2010	
Commessa	Descrizione Commessa				
C10001	EDILIZIA IL FUTURO			Data Inizio : 01/09/2004	
	VIA PADOVA				
	MILANO			Data Chiusura :	
	C_CLIENTE1				
	CLIENTE 1				
	VIA GARGANTINI 25				
	20100	MILANO		MI	
TOTALE MATERIALI			36,00		
TOTALE ORE			300,00		
TOTALE COMMESSA	C10001		336,00		

8) Mastrini movimenti commesse


La stampa riporta la movimentazione dei singoli materiali nella commessa


Mastrini Movimenti Commesse					Periodo dal		01/01/2010	al		31/12/2010	Stampa del		01/04/2010
(stpmcoma)													
Codice Articolo		Descrizione Articolo								Um			
Commessa		Descrizione Commessa											
N.Reg.	del	Cat	N. Doc.	Data Doc.	C/Parte	Q.ta. Entrate	Val. Entrate	Q.ta. Uscite	Val. Uscite	Prz. Unitario			
M_MATEDILE01		MATERIALE EDILE 01								N.			
C10001		EDILIZIA IL FUTURO											
33	02/03/2010	XCC		02/03/2010	Mag. C.le	101	1.818,00			18,00			
36	05/03/2010	XCD	1		F_FORNITO	55	990,00			18,00			
37	02/03/2010	XCC	B00002	02/03/2010	Mag. C.le	8	144,00			18,00			
38	02/03/2010	XRC			Mag. C.le	-100	-1.800,00			18,00			
119	21/12/2010	XCC		21/12/2010	Mag. C.le	2	36,00			18,00			
TOTALI COMMESSA						66	1.188,00						
TOTALI ARTICOLO						66	1.188,00						
SALDO						66	1.188,00						

Avanzamento Commesse

Gestione Voci Capitoli

La funzione permette di importare o di inserire in modo manuale le voci del capitolato di una commessa. Per importare un capitolato si preme il pulsante Importa Voci e si seleziona il tipo di file da importare. Attualmente è prevista la importazione dal formato ACCA oppure da un file personalizzato.

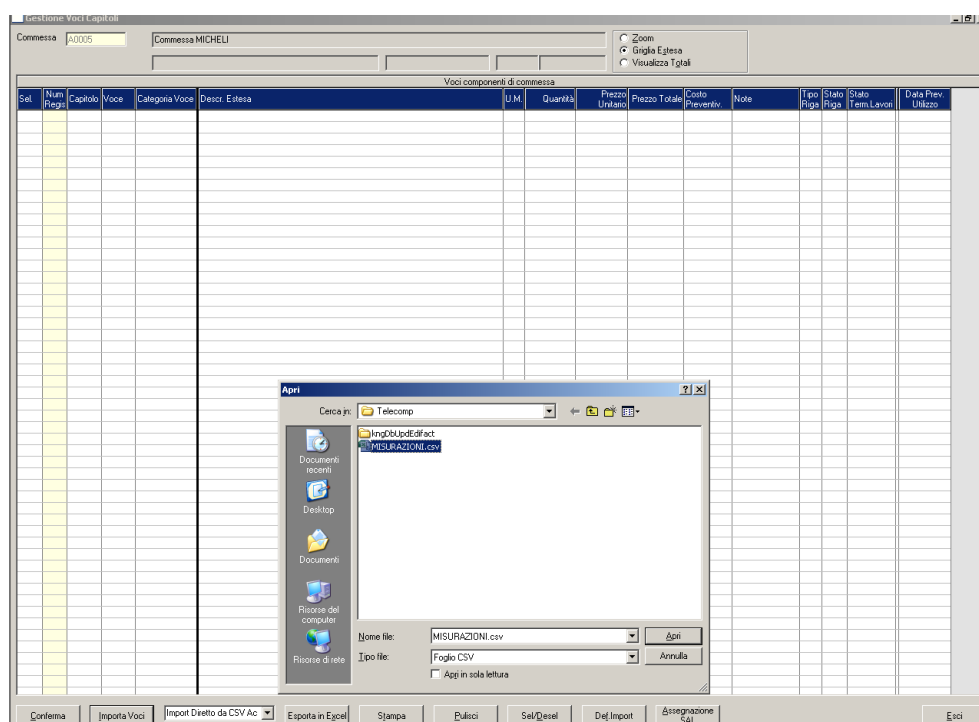

Nr.	Voce	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	2A.01	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splattamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s...zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq. MISURAZIONI: FONDAZIONE - NORD - SUD							
			4,00	14,40	12,000	6,850	4734,72		
		Si detrae passaggio centrale	2,00	12,00	8,000	6,200	1190,40		
				8,00	6,800	6,400	-348,16		
		SOMMANO m3					5576,96	2,32	12938,55
2	2A.01A	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splattamento, eseguito MISURAZIONI: FONDAZIONE - NORD - SUD Lato Sud							
				15,00	18,400	6,400	1766,40		
				7,00	14,500	8,800	893,20		
			3,00	8,00	10,600	6,700	1704,48		
		Si detrae passaggio centrale	2,00	2,50	1,200	3,000	-18,00		
		* Parziale m3					4346,08		
		Lato Nord	3,00	10,00	3,550	5,600	596,40		
				8,00	8,400	7,450	500,64		
		SOMMANO m3					5443,12	2,32	12628,04

Le voci di capitolo sono organizzate per codice di capitolo e per voce

I codici dei capitoli sono gestiti per la singola commessa

gestione voci Capitoli

Commessa: A00100 NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI

Via Po 12 Milano C0105000 01/01/2010

Zoom
 Griglia Estesa
 Visualizza Totali

Voci componenti di commessa

Sel.	Num. Regis.	Capitolo	Voce	Categoria Voce	Descr. Estesa	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Costo Preventiv.	Note	Tipo Riga	Stato Riga	Stato Term. Lavori	Data Prev. Ultimo
<input type="checkbox"/>	1	C1	2A.01	1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento, eseguito con qualsiasi me	m3	5.576,96	2,32	12.930,55			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	2	C1	2A.01A	1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento, eseguito con qualsiasi me	m3	5.443,12	2,32	12.628,04			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	3	C1	2A.01B	1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento, eseguito con qualsiasi me	m3	5.937,49	2,32	13.774,98			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	4	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	13.592,73	,77	10.466,40			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	5	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	12.526,05	,77	9.645,06			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	6	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m	m2	103,50	20,14	2.084,49			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	7	C2	3E.01c	5	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo	m3	174,75	68,17	11.912,71			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	8	C2	3E.01c	5	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo	m3	171,44	68,17	11.687,06			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	9	C2	3E.12D	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	11.945,65	,77	9.198,15			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	10	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	13.305,13	,77	10.244,95			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	11	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m	m2	99,00	20,14	1.993,86			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	12	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m	m2	81,00	20,14	1.631,34			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	13	C3	3E.18	4	Solai in cemento armato e laterizi, costituito da pignette interposte e travetti prefab	m2	720,00	32,02	23.054,40			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	14	C3	01.0145	5	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di lateri	m2	788,76	49,06	38.696,57			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	15	C3	1N.05	5	Intonaco a ""mezzo stucco romano"" formato da un'acciatura di malta fine ritinta	m2	2.177,76	10,02	21.821,16			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	16	C3	1U.09	5	Trinteggiatura a calce, bianca, con due mani di pompa su pareti e soffitti di ambienti	m2	2.177,76	1,29	2.809,31			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	17	C3	1M.07	5	Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due	m2	110,00	7,44	818,40			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	18	C3	101979	6	Porta interna in legno di abete tamburata a struttura cellulare, intelaiatura interna a r	m2	19,52	70,75	1.381,04			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	19	C3	101970	6	Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza	m	132,85	18,27	2.427,17			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	20	C3	109011	6	Porta di caposcala, a uno o due battenti, uguali o di diversa larghezza, tamburata a	m2	24,88	310,01	7.713,05			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	21						,00	,00	,00						01/02/2010

Tabella Capitoli per Commessa: A00100

Capitolo	Descrizione
C1	Lavori di preparazione
C2	Lavori murari di base
C3	Finiture

Capitolo: F9 lista Agg Capitoli
 Categoria: Agg Categorie
 Data Pre. Ut.: Agg Date

TOTALE PER DATE

Data	Descrizione	Qta	Importo Totale

Conferma Importa Voci Import Diretto da CSV Ac Esporta in Excel Stampa Pulisci Sel/Desel Def Import Assegnazione SAL Esci

Le categorie di Voci invece sono generali e quindi comuni per tutte le commesse.

Qualora le categorie non siano presenti nel file di importazione è possibile assegnarle selezionando le voci dopo avere selezionato l'opzione di visualizzazione 'Visualizza Totali'.

Capitolo: F9 lista Agg Capitoli
 Categoria: Agg Categorie
 Data Pre. Ut.: Agg Date

Totale per Capitolo
 Totale per Categorie
 Totale per Date P.U.

TOTALE CAPITOLI

Capitolo	Descrizione	Qta	Importo Totale
<VUOTI>		0	0
C1	Lavori di preparazione	16967,57	39341,57
C2	Lavori murari di base	51999,25	68864,02
C3	Finiture	6151,53	98221,1
TOTALE		75108,35	206326,69

Conferma Importa Voci Import Diretto da CSV Ac Esporta in Excel Stampa Pulisci Sel/Desel Def Import Assegnazione SAL Esci

Nella sezione in basso a destra è possibile ottenere riepiloghi delle quantità e degli importi per capitolo, categoria e per data di prevista ultimazione

Totale per Capitolo	TOTALE CATEGORIA			
Totale per Categorie	Categoria	Descrizione	Qta	Importo Totale
Totale per Date P.U.	<VUOTE>		0	0
	1	Scavi	16957,57	39341,57
	2	Armature	51369,56	39554,56
	3	Casseforme	283,5	5709,69
	4	Solaio	720	23054,4
	5	Muratura	5600,47	87745,21
	6	Porte	177,25	11521,26
	TOTALE		75108,35	206926,69

Totale per Capitolo	TOTALE PER DATE			
Totale per Categorie	Data	Descrizione	Qta	Importo Totale
Totale per Date P.U.	01/02/2010		43157,35	61084,37
	01/03/2010		25799,47	47121,22
	01/04/2010		6151,53	98721,1
	<VUOTE>		0	0
	TOTALE		75108,35	206926,69

Con l'opzione di visualizzazione Zoom invece nella sezione in basso vengono riportati i singoli campi che compongono le righe in modo tale di avere una visione completa senza spostare le colonne della griglia.

Gestione Voci Capitoli
 Commessa: A00100 | NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI
 Via Po 12 | Milano | C0105000 | 01/01/2010

☒ Zoom
☐ Griglia Estesa
☐ Visualizza Totali

Set	Num. Regis	Capitolo	Voce	Categoria Voce	Descr. Estesa	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Costo Preventiv.	Note	Tipo Riga	Stato Riga	Stato Term. Lavori	Data Prev. Utilizzo
<input type="checkbox"/>	1	C1	2A.01	1	Scavo a sezione aperta, per sbancamento e splattamento, eseguito con qualsiasi mezzo	m3	5.576,96	2,32	12.938,55			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	2	C1	2A.01A	1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splattamento, eseguito con qualsiasi mezzo	m3	5.443,12	2,32	12.628,04			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	3	C1	2A.01B	1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splattamento, eseguito con qualsiasi mezzo	m3	5.937,49	2,32	13.774,98			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	4	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	13.592,73	,77	10.466,40			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	5	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	12.526,05	,77	9.645,06			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	6	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m e	m2	103,50	20,14	2.084,49			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	7	C2	3E.01c	5	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo	m3	174,75	68,17	11.912,71			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	8	C2	3E.01c	5	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo	m3	171,44	68,17	11.687,06			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	9	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	11.945,65	,77	9.198,15			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	10	C2	3E.12d	2	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle	Kg	13.305,13	,77	10.244,95			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	11	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m e	m2	99,00	20,14	1.993,86			A			01/03/2010
<input type="checkbox"/>	12	C2	90420	3	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m e	m2	81,00	20,14	1.631,34			A			01/02/2010
<input type="checkbox"/>	13	C3	3E.18	4	Solaio in cemento armato e laterizi, costituito da pignone interposte e travetti prefabbricati	m2	720,00	32,02	23.054,40			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	14	C3	01.0145	5	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizi	m2	788,76	49,06	38.696,57			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	15	C3	1N.05	5	Intonaco a "mezzo stucco romano" formato da un'ariciatura di malta fine rifinita	m2	2.177,76	10,02	21.821,16			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	16	C3	1U.09	5	Tinteggiatura a calce, bianca, con due mani di pompa su pareti e soffitti di ambienti	m2	2.177,76	1,29	2.809,31			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	17	C3	1M.07	5	Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due	m2	110,00	7,44	818,40			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	18	C3	101973	6	Porta interna in legno di abete lambrata a struttura cellulare, intalasciatura interna a	m2	19,52	70,75	1.381,04			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	19	C3	101970	6	Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori lotti, di altezza 7,5 cm e lunghezza	m	132,95	18,27	2.427,17			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	20	C3	109011	6	Porta di caposcala, a uno o due battenti, uguali o di diversa larghezza, lambrata a	m2	24,88	310,01	7.713,05			A			01/04/2010
<input type="checkbox"/>	21						,00	,00	,00						01/02/2010

Zoom Num: 1
 Capitolo: C1
 Voce: 2A.01
 Categoria Voce: 001
 Num. Ele. Pre.:
 Descr. Succinta:


Descr. Estesa: Scavo a sezione aperta
 U.M.: m3
 Quantità: 5576,96
 Prezzo Unitario: 2,32
 Prezzo Totale: 12938,55
 Prezzo Riservato:

Costo Preventiv.:
 Note:
 Tipo Riga:
 Data Rettifica:
 Rif. Ord. Rettifica:
 Stato Riga: A

Stato Term. Lavori:
 Perc. Fatturato:
 Dettaglio Commes:
 id: 41
 Data Prev. Utilizzo:


Gestione dettaglio voci di capitolo

La funzione permette di assegnare alle singole voci i materiali che dovranno essere forniti in base alle date di ultimazione delle voci. I materiali possono essere ordinati direttamente ai fornitori.

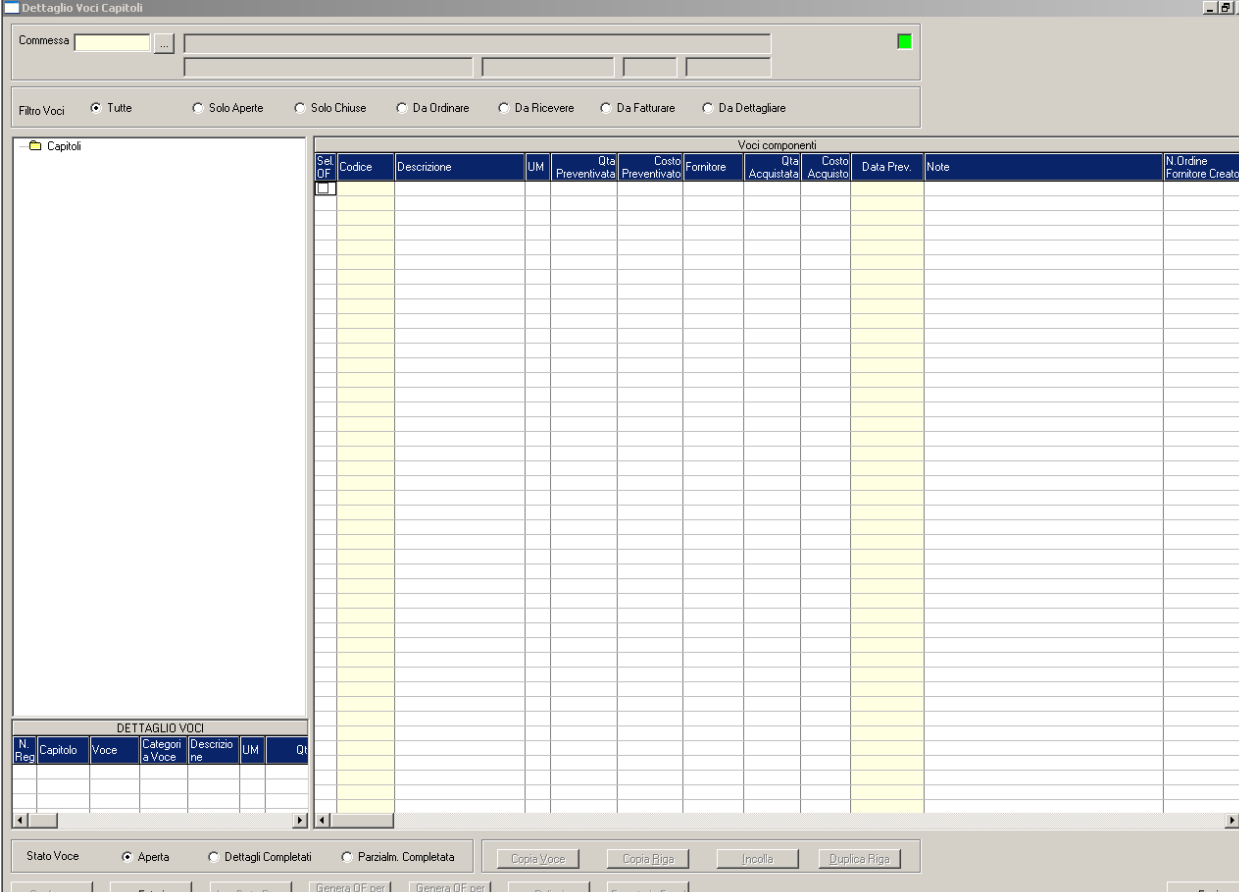

The screenshot shows the 'Dettaglio Voci Capitoli' window. At the top, there is a 'Commissa' field with a dropdown arrow. Below it is a 'Filtro Voci' section with radio buttons for 'Tutte', 'Solo Aperte', 'Solo Chiuse', 'Da Ordinare', 'Da Ricevere', 'Da Fatturare', and 'Da Dettagliare'. The 'Tutte' button is selected. On the left, there is a tree view labeled 'Capitoli'. The main area is a large table with the following columns: 'Set OF', 'Codice', 'Descrizione', 'UM', 'Qta Preventivata', 'Costo Preventivato', 'Fornitore', 'Qta Acquisitata', 'Costo Acquisito', 'Data Prev.', 'Note', and 'N. Ordine Fornitore Creato'. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'STATO VOCE' section with radio buttons for 'Aperta', 'Dettagli Completati', and 'Parzialm. Completata'. Below this are buttons for 'Copia Voce', 'Copia Riga', 'Incolla', 'Duplica Riga', 'Conferma', 'Estrai', 'Agg. Data Prev.', 'Genera OF per Voce', 'Genera OF per Commissa', 'Eufisci', 'Esporta in Excel', and 'Esci'.

Dopo avere selezionato la commessa è possibile scegliere righe di interesse in base agli stati che vengono attribuiti a seguito delle operazioni che vengono inserite.



This screenshot shows the 'Dettaglio Voci Capitoli' window with the 'Commissa' field populated with 'A00100'. The 'Filtro Voci' section is still visible with the 'Tutte' button selected. The main table area is not visible in this view.

Dopo avere caricato la commessa viene visualizzato l'albero con l'elenco dei capitoli presenti

[illegible]

L'utente seleziona dapprima il capitolo su cui operare e poi si posiziona sulla singola voce.

Per ogni voce legata all'impiego di materiali si devono inserire i codici degli articoli che dovranno essere utilizzati con i relativi costi previsti e la data di previsto utilizzo.

[illegible]

Contestualmente oppure successivamente si specifica il fornitore ed il prezzo di acquisto.

È possibile ordinare lo stesso articolo a più fornitori suddividendo la quantità prevista.

Dettaglio Voci Capitoli

Commissa: A00100 | NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI
 Via Po 12 | Milano | C0105000 | 01/01/2010

Filtro Voci: ☒ Tutte ☐ Solo Aperte ☐ Solo Chiuse ☐ Da Ordinare ☐ Da Ricevere ☐ Da Fatturare ☐ Da Dettagliare

VOCI COMPONENTI - 19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15 cm, con bordo superiore sagomato a becco di civetta.

Set OP	Codice	Descrizione	UM	Qta Preventivata	Costo Preventivato	Fornitore	Qta Acquisita	Costo Acquisito	Data Prev.	Note
<input type="checkbox"/>	ZCBT1	Zoccolino battiscopa testa di moro	MT	100,00	1,50	F02150004	100,00	1,45	01/04/2010	
<input type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	1,40	F02150004	25,00	1,35	01/04/2010	
<input type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	1,40	F02150005	25,00	1,30	01/04/2010	

È possibile duplicare le righe nel caso in cui si deve ordinare l'articolo a più fornitori oppure copiare singole righe o tutte le righe di una voce per inserirle in altre voci nel caso in cui il materiale sia lo stesso.

Stato Voce: ☐ Aperta ☒ Dettagli Completati ☐ Parziali Completati

È possibile generare gli ordini a fornitore in base a singole voci oppure per tutte le voci selezionate per la commessa.

I materiali dello stesso fornitore vengono raggruppati in un unico ordine

Dettaglio Voci Capitoli

Commissa: A00100 | NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI
 Via Po 12 | Milano | C0105000 | 01/01/2010

Filtro Voci: ☒ Tutte ☐ Solo Aperte ☐ Solo Chiuse ☐ Da Ordinare ☐ Da Ricevere ☐ Da Fatturare ☐ Da Dettagliare

VOCI COMPONENTI - 19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15 cm, con bordo superiore sagomato a becco di civetta.

Set OP	Codice	Descrizione	UM	Qta Preventivata	Costo Preventivato	Fornitore	Qta Acquisita	Costo Acquisito	Data Prev.	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT1	Zoccolino battiscopa testa di moro	MT	100,00	15,00	F02150004	100,00	145,00	01/04/2010	
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	14,00	F02150004	25,00	135,00	01/04/2010	
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	14,00	F02150005	25,00	13,00	01/04/2010	

Generazione Ordini Fornitori

Commissa: A00100 | NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI

Ordini Fornitori: Protocollo:

Data Ordine: 01/01/2006

Set	Fornitore	Ragione Sociale For.	Importo Ordine	Ord For Creato
<input checked="" type="checkbox"/>	F02150004	DOMOLINE S.A.P.A.	29,00	
<input type="checkbox"/>	F02150005	COLORAMA SNC	14,00	

Le righe che sono state completamente ordinate vengono colorate e bloccate

VOCI COMPONENTI - 19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15 cm, con bordo superiore sagomato a becco di civetta.													
		Codice	Descrizione	UM	Qta Preventivata	Costo Preventivato	Fornitore	Qta Acquistata	Costo Acquisito	Data Prev.	N. Ordine Fornitore Creato	Ordinato a Fornitore	Qta Ricevuta
C1 - Lavori di preparazione		ZCBT	Zoccolino battiscopa testa di moro	MT	100,00	15,00	F02150004	100,00	145,00	01/04/2010	F0000018	<input checked="" type="checkbox"/>	0
C2 - Lavori murari di base		ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	14,00	F02150004	25,00	135,00	01/04/2010	F0000018	<input checked="" type="checkbox"/>	0
C3 - Finiture		ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	MT	50,00	14,00	F02150005	25,00	13,00	01/04/2010	F0000019	<input checked="" type="checkbox"/>	0
13 - 3E.18 - Solaio in cemento armato e laterizi, c												<input type="checkbox"/>	
14 - 01.0145C - Muratura a cassa vuota per chi													
15 - 1N.05 - Intonaco a "mezzo stucco romano"													
16 - 1U.09 - Tinteggiatura a calce, bianca, con c													
17 - 1M.07 - Manto impermeabile a caldo, su sup													
18 - 10.1979 - Porta interna in legno di abete tan													
19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle													
20 - 109.01.1.006 - Porta di caposcala, a uno o													


Questa è la situazione degli ordini emessi

Consultazione Ordini Fornitori											
Da Data Reg.	10/01/2006	A Data Reg.	10/01/2006	Codice Documento:	<input type="checkbox"/> Inevasi <input type="checkbox"/> Parz. evasi <input type="checkbox"/> Evasi <input type="checkbox"/> Stampati	Da Articolo	<input type="text"/>	A Articolo	<input type="text"/>		
Da Numero	<input type="text"/>	A Numero	<input type="text"/>	Valuta	<input type="text"/>						
Da Fornitore	<input type="text"/>	A Fornitore	<input type="text"/>								
Da Data Consegna	<input type="text"/>	A Data Consegna	<input type="text"/>								

N. Ord.	Data Ord.	Data. cons.	Fornitore	Denominazione	Codice Articolo	Descrizione	Valuta	Qta Ord.	Qta Evasa	Tot. Ord.	Evasione
F0000018	10/01/2006	10/01/2006	F02150004	DOMOLINE S.A.P.A.	ZCBT	Zoccolino battiscopa testa di moro	EURO	100,00	0,00	15,00	INEVASO
F0000018	10/01/2006	10/01/2006	F02150004	DOMOLINE S.A.P.A.	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	EURO	50,00	0,00	14,00	INEVASO
F0000019	10/01/2006	10/01/2006	F02150005	COLORAMA SNC	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocciola	EURO	50,00	0,00	14,00	INEVASO

In seguito al ricevimento della merce viene visualizzata la quantità ricevuta

Dettaglio Voci Capitoli												
Commissa		A00100		NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI								
		Via Po 12		Milano		C0105000		01/01/2010				
Filtro Voci		<input checked="" type="radio"/> Tutte <input type="radio"/> Solo Aperte <input type="radio"/> Solo Chiuse <input type="radio"/> Da Ordinare <input type="radio"/> Da Ricevere <input type="radio"/> Da Fatturare <input type="radio"/> Da Dettagliare										
Capitoli												
C1 - Lavori di preparazione												
C2 - Lavori murari di base												
C3 - Finiture												
13 - 3E.18 - Solaio in cemento armato e laterizi, c												
14 - 01.0145C - Muratura a cassa vuota per chi,												
15 - 1N.05 - Intonaco a "mezzo stucco romano"												
16 - 1U.09 - Tinteggiatura a calce, bianca, con c												
17 - 1M.07 - Manto impermeabile a caldo, su sup												
18 - 10.1979 - Porta interna in legno di abete tan												
19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle												
20 - 109.01.1.006 - Porta di capriccola, a uno o												
VOCI COMPONENTI - 19 - 10.1970 - Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15 cm, con bordo superiore sagomato a becco di civetta.												
Sei OP	Codice	Descrizione	UM	Qta Preventivata	Costo Preventivato	Fornitore	Qta Acquisita	Costo Acquisito	Data Prev.	N. Ordine Fornitore Creato	Ordinato a Fornitore	Qta Ricevuta
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT	Zoccolino battiscopa testa	MT	100,00	15,00	F02150004	100,00	145,00	01/04/2010	F0000018	<input checked="" type="checkbox"/>	25
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocce	MT	50,00	14,00	F02150004	25,00	135,00	01/04/2010	F0000018	<input checked="" type="checkbox"/>	25
<input checked="" type="checkbox"/>	ZCBT2	Zoccolino battiscopa nocce	MT	50,00	14,00	F02150005	25,00	13,00	01/04/2010	F0000019	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>												



Esempio di stampa senza dettaglio.

Vengono stampati i due fornitori a cui è stato ordinato il materiale e in coda viene stampata una riga generica 'Fornitore non assegnato' nella quale confluiscono gli articoli che sono stati dettagliati ma che non sono ancora stati ordinati.

I valori nelle colonne sono i seguenti;

- Preventivato: importo del preventivato
- Extra: importo delle voci extracontrattuali aggiunte nel capitolato
- Ordinato: valore dell'ordinato a fornitore
- Residuo da ordinare: residuo da ordinare per il fornitore
- Fatture ricevute: è ottenuto in base alle fatture che sono state collegate al ricevimento della merce attraverso il controllo fatture fornitori.
- Residuo su ordinato: importo delle fatture ancora da ricevere in base all'ordinato
- Residuo su preventivato: residuo calcolato sul preventivato

RESIDUO COSTI PER COMMESSA							
Stampato il 31/01/11 alle 15.11							
NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI Via Po 12	A00100 Milano	Previsione inizio lavori il	Termine lavori il				
Fornitore	Preventivato	Extra	Ordinato	Residuo da ordinare	FATTURATO		
					Fatture Ricevute	Residuo su Ordinato	Residuo su Preventivato
F0215000 D OMOLINE S.A.P.A.	1.850,00		1.975,00		160,00	1.815,00	1.690,00
F0215000 COLORDRAMA SNC	350,00		325,00			325,00	350,00
FORNITORE NON ASSEGNATO	400,00						400,00
RIEPILOGO COMMESSA	2.600,00	0,00	2.300,00		160,00	2.140,00	2.440,00

Esempio della stessa stampa con i dettagli

RESIDUO COSTI PER COMMESSA									
Stampato il 31/01/11 alle 15.08									
NUOVO FABBRICATO AD USO UFFICI Via Po 12		A00100 Milano		Previsione inizio lavori il		Termine lavori il			
Fornitore		Preventivato	Extra	Ordinato	Residuo da ordinare	FATTURATO			
						Fatture Ricevute	Residuo su Ordinato	Residuo su Preventivato	
F02150004	DOMOLINE S.A.P.A.								
C3	10.197 ZCB7	Zoccolino battiscopa testa di moro MT	100,00 1.500,00	100,00 1.600,00		160,00	1.440,00	1.340,00	
C3	10.197 ZCB72	Zoccolino battiscopa nocciola MT	25,00 350,00	25,00 375,00			375,00	350,00	
F0215000	DOMOLINE S.A.P.A.	TOTALE	1.850,00	1.975,00		160,00	1.815,00	1.690,00	
F02150005	COLORAMA SNC								
C3	10.197 ZCB72	Zoccolino battiscopa nocciola MT	25,00 350,00	25,00 325,00			325,00	350,00	
F0215000	COLORAMA SNC	TOTALE	350,00	325,00			325,00	350,00	
FORNITORE NON ASSEGNATO									
C3	10.197 PORTA01	PORTA IN LEGNO 01 N.	1 400,00		1			400,00	
F0215000	FORNITORE NON ASSEGNATO	TOTALE	400,00					400,00	
RIEPILOGO COMMESSA		2.600,00	0,00	2.300,00		160,00	2.140,00	2.440,00	

Stampa tesoreria commessa

La stampa della tesoreria permette di ottenere la situazione finanziaria della commessa in base alle fatture di SAL emesse e in base alle fatture di acquisto ricevute.

Importo commessa totale vendita	Stato commessa		Residuo Commessa	Scadenziario Incassi SAL a 60/90 gg fm	
---------------------------------	----------------	--	------------------	--	--

SAL Importo

1.000.000,00	31/01/2007	50.000,00	950.000,00	31/03/2007	25.000,00
	28/02/2007	25.000,00	925.000,00	30/04/2007	37.500,00
	31/03/2007	30.000,00	895.000,00	31/05/2007	27.500,00
				30/06/2007	15.000,00

Totale	1.000.000,00	105.000,00	895.000,00	105.000,00
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Importo totale costi preventivati sulla commessa	Pagamento Fornitori x Commessa	SAL	Importo	Scadenziario Pagamenti Fornitori a 60/90 gg fm	
800.000,00	Fornitore 0001	31/01/2007	25.000,00	31/03/2007	22.000,00
	Fornitore 0002	31/01/2007	19.000,00	30/04/2007	33.000,00
	Fornitore 0003	28/02/2007	10.000,00	31/05/2007	24.750,00
	Fornitore 0004	28/02/2007	12.000,00	30/06/2007	13.750,00
	Fornitore 0001	31/03/2007	13.500,00		
	Fornitore 0002	31/03/2007	14.000,00		

Totale	800.000,00	93.500,00	93.500,00
---------------	-------------------	------------------	------------------

		Incassi	Pagamenti	Saldo
TESORERIA	31/03/2007	25.000,00	22.000,00	3.000,00
	30/04/2007	37.500,00	33.000,00	4.500,00
	31/05/2007	27.500,00	24.750,00	2.750,00
	30/06/2007	15.000,00	13.750,00	1.250,00

Totale	105.000,00	93.500,00	11.500,00
---------------	-------------------	------------------	------------------

Commesse Cantieri

Gestione amministrativa e contabile completa delle commesse su cantieri e impianti, con analisi della redditività e dei SAL

Commesse per cantieri e impianti

Gestione Commesse Cantieri

- Gestione economica della commessa
- Movimentazione automatica di merci e materiali
- Attribuzione di costi diretti sulla commessa
- Gestione delle ore di manodopera
- Costi Imprese esterne
- Contratti commesse
- Consuntivazione
- Stampe di controllo
- Tipologie di movimentazioni

Movimentazioni

- Carico di materiali sulla commessa
- Scarico e carico automatico del magazzino
- Trasferimenti di materiali tra commesse che non influenzano la situazione di magazzino, e resi tra le commesse e il magazzino
- Movimenti d'inventario di commessa
- Gestione archivio dei subappalti collegati alla commessa
- Ricevimento Ordini da Fornitori
- La stampa analitica dei materiali
- Stampa sintetica
- Stampa di riepilogo

Gestione Costi del personale

- Ore di manodopera per commessa
- Stampa foglio presenze
- Rimborso spese
- Controllo dei costi di manodopera e dell'impegno delle risorse sulla singola commessa o su più commesse in un determinato periodo

Stampe di analisi e controllo redditività

- Statistiche analitiche personalizzabili
- Analisi costi / ricavi della commessa
- Controllo dei costi di manodopera

Gestione capitolati e Avanzamento Commesse

- Caricamento Capitolati per commessa da EXCEL o file CSV
- Voci di capitolo con Articoli e ordini a Fornitori
- Avanzamento lavori (SAL e fatturazioni a saldo)
- Consuntivi e analisi per capitolati
- Stampa Residui di commessa
- Stampa tesoreria di commessa
- Collegamento con Cash Flow

© DATALOG ITALIA SRL - Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l'assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte di DATALOG ITALIA SRL verso tali utenti. In particolare DATALOG ITALIA SRL non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento.
